


●工事状況

今月に入り、2階まで区画壁LGS組の検査が終了し、作業に関しては現在7階まで進んでおり上階も次々と新しい部屋の間取りへと変わっていきます。また、先月より稼働を開始したロングスパンエレベーターが本格的に使用されるようになりました。これを活用し、各階へ内装材を搬入することで、効率よく円滑に作業を行える環境になっています。

今月中旬から急激に冷え込み風邪をひきやすくなる季節になりましたが、体調管理を万全にして着実に作業を進めて参ります。

代表写真《3号館 3階LGS組立状況》

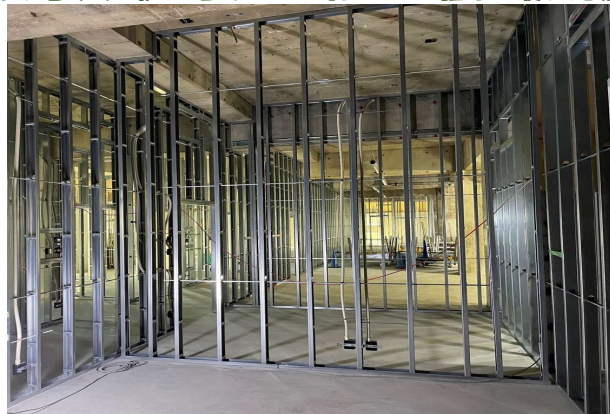


●ヒトワザ！

天井内には、給水管や給湯管、排水管、冷媒管、医療用ガス配管など様々な配管を取り付けます。これらの配管の接合方法には「溶接接合」と「火無し継手」の2種類があります。

溶接接合に比べて、火無し継手は技能者の確保が容易で、施工時間も短いため工期短縮が可能であり、火無しのため火災リスクがないというメリットがあります。

今回工事では「火無し継手」を採用しています。

設備（空調・消火）について…

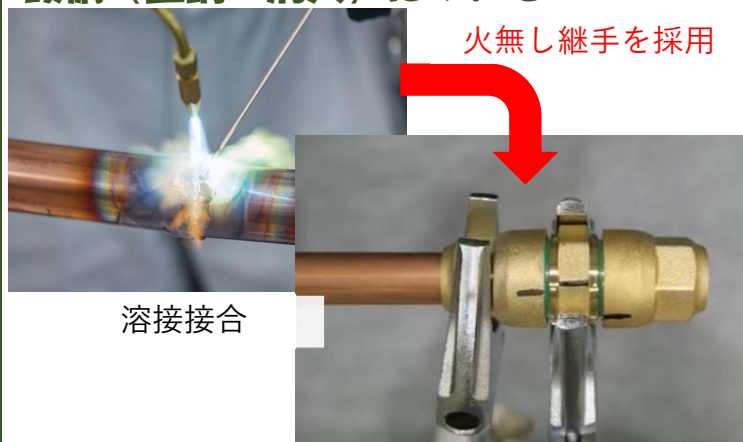

	令和6年 11月	工事進捗率 12月	18.7%
建具工事	1・2階 銅製建具取付	3・4・5・6・7・8階 銅製建具取付	
内装工事	2・3・4・5・6・7・8階 区画壁LGS/ B1・1・2階 区画壁PB	5階・9階 区画壁LGS/ 1・2・3・4・5・6・7階 区画壁PB	
設備工事	2・3・4・5・6階 壁内配線・配管/ B1階 天井内配線・配管	5・9階 壁内配線・配管/ B1・1・2・3・4階 天井内配線・配管	

●GLOBAL CAFE《紅葉》

紅葉という言葉は日本語の勉強をする中で良く触れており、馴染みのある言葉でした。去年の秋に日本で紅葉を見たことがあり、赤く色付く木々は本当に美しいと感じました。ミャンマーの季節は年間を通して温暖で有り、夏季の終わりに黄色くなった葉っぱはすぐ落ちてしまうため、日本の紅葉のような期間はありません。

夏が過ぎ、緑色だった木の葉が少しずつ赤や黄色に変わっていく姿を見て時間が経つを感じ、自分も何か変わってきていることがあるのかなという気持ちになりました。

浜松市の紅葉スポットを上司に伺ったところ、浜松城公園と佐鳴湖と教えてもらいましたので、紅葉狩りをしたいと思います。

ナンより

