

●工事状況

今月は各階で塗装・クロス張り作業が行われています。どちらの作業も、素材や色を部屋毎に使い分けており、施工前の様子から部屋の雰囲気さがらりと変えています。

これらの作業に加えて、家具取付け作業も行われています。仕上げと共に検査を実施し、仕上り具合をより高めていきます。

また、今後は気温が高くなっていくため熱中症対策が重要となります。日々の声掛け、熱中飮や緊急対応用の経口補水液を準備し、万全の体制で工事を進めて参ります。

代表写真《壁仕上状況》




●ヒトワザ！

南館基礎解体工事は基礎と歩道の離隔がないため、歩道の崩落防止策として山留めを施しており、今回は鋼矢板（シートパイル）工法を採用しております。


鋼矢板工法は文字通り鉄の板を挿入することで山留め構築が完了し、基礎解体後は引抜くことで地中へ残置することなく完了することができます。

打込みには超低騒音型建設機械として国土交通省に認定された機械による「CHV工法」を採用しており、超低騒音・低振動により公害を引き起こすことがなくかつ安全作業にて進めております。

鋼矢板（シートパイル）工法

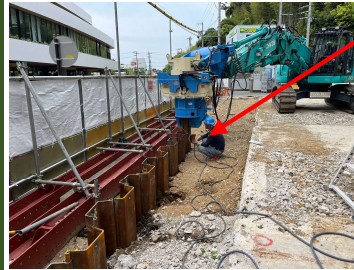

CHV(Center Hole Vibrohammers)工法にて鋼矢板を打込み

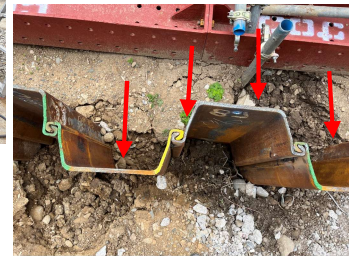

土圧をうける鋼矢板が歩道側の崩落を防ぐ

●工程


	令和7年 5月	工事進捗率	51.8%
	6月		
解体工事	南館基礎解体用シートパイル打設 / 南館基礎解体	南館基礎解体	
内装工事	各階 塗装・クロス張り / 各階家具取付	各階 塗装・クロス張り・床仕上げ	
設備工事	各階 天井壁器具付け	各階 天井壁器具付け	

●GLOBAL CAFE《ゴールデンウィーク・浜松まつり》

仕事に夢中になって過ごしていたら、いつの間にかゴールデンウィークを迎えていました。皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごしましたか？私は綺麗な富士山を見ながらパラグライダーをしました。富士山の景色がとても綺麗で、初めての経験だったため、気持ちが高揚して楽しかったです。

また、浜松祭りの屋台引き回しも観に行き、浜松駅周辺はたくさんの人で賑わっており、たくさんの町からの屋台引き回しを観て、子供の頃に参加したミャンマーのカティナ祭りを思い出しました。浜松祭りでたくさんの人が声を出しながら楽しんでいる姿を見て、自分も楽しい気持ちになりミャンマーの事を思い出した楽しいゴールデンウィークを過ごしました。

ナンより



浜松祭り屋台引き回し



ミャンマーカティナ祭り
