


### ●工事状況

先月に引き続き、3号館では各フロアで内装工事のまとめの作業を行っています。夏季休暇後からは本格的に仕上検査を開始し、お客様に問題なくお引渡しができるように隅々まで確認しています。

南館跡地では室外機置場基礎工事を行っており、掘削工事、埋設配管工事をする際は、既存の配管を傷つけないように慎重に作業を行っています。

残暑が続きますが、引続き現場内での熱中症対策を万全にして安全第一で作業を進めてまいります。

### 代表写真《外構（シートパイル引抜き・室外機置場基礎）状況》

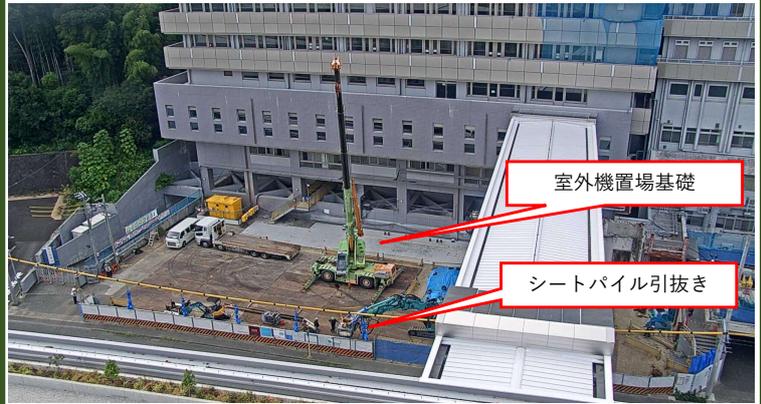

室外機置場基礎

シートパイル引抜き

### ●ヒトワザ！

今回、外壁としてALCを使用しています。ALCとはAutoclaved Lightweight aerated Concrete(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート)の頭文字をとって名付けられ、板状に成形したものを指します。ALCは内部の補強鉄筋により構造部材としての強さを発揮し、軽量で加工性・断熱性に優れ、外壁・間仕切壁・床などとして住宅、工場、高層ビルまであらゆる建築に用いられています。上記の性能を発揮するには、現場での支持金物の取付位置、溶接長さ確保、躯体とのクリアランス確保が重要であり、所定の基準で納める必要があります。

### ALC工事について…



①ALC搬入

②定規アングル溶接

③溶接長さ確保

④ALC建込み

⑤開口補強溶接

⑥完了

| ●工程  | 令和7年<br>8月                           | 工事進捗率               | 63.5%                   |
|------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|      | 外構工事                                 | 室外機置場基礎躯体工事（土工事・配筋） | 9月                      |
| 内装工事 | 各階 塗装・床仕上げ / 1階ALC / 渡り廊下棟2～3階区画壁LGS |                     | 仕上り検査 / 渡り廊下棟1～3階区画壁LGS |
| 設備工事 | 各階 天井壁器具付け / 渡り廊下棟区画壁内配線・配管          |                     | 仕上り検査 / 渡り廊下棟区画壁内配線・配管  |

### ●GLOBAL CAFE《夜空を彩る光》

皆さん日本の夏を象徴するものは何だと思いませんか？私は文化と季節の美しさが一つになる花火大会だと思います。夜空に咲く大輪の花火は見る人の心を明るくしてくれます。

花火は江戸時代から親しまれており、今でも全国各地で様々な大会が開かれています。佐鳴湖で開かれる花火大会は私にとって特別な体験です。ミャンマーではこのような大規模な花火大会は少なく、人々が浴衣を着て集まり、屋台を楽しむ光景も新鮮でした。

花火大会を通して日本の夏を楽しむ心に触れることができ、忘れられない思い出になりました。来年もまた同じ空の下で花火を見られる日が待ち遠しいです。



ニンより

花火大会
